


平成19年度府中市交通バリアフリー
特定事業計画の実施について

平成20年7月

都市整備部土木課

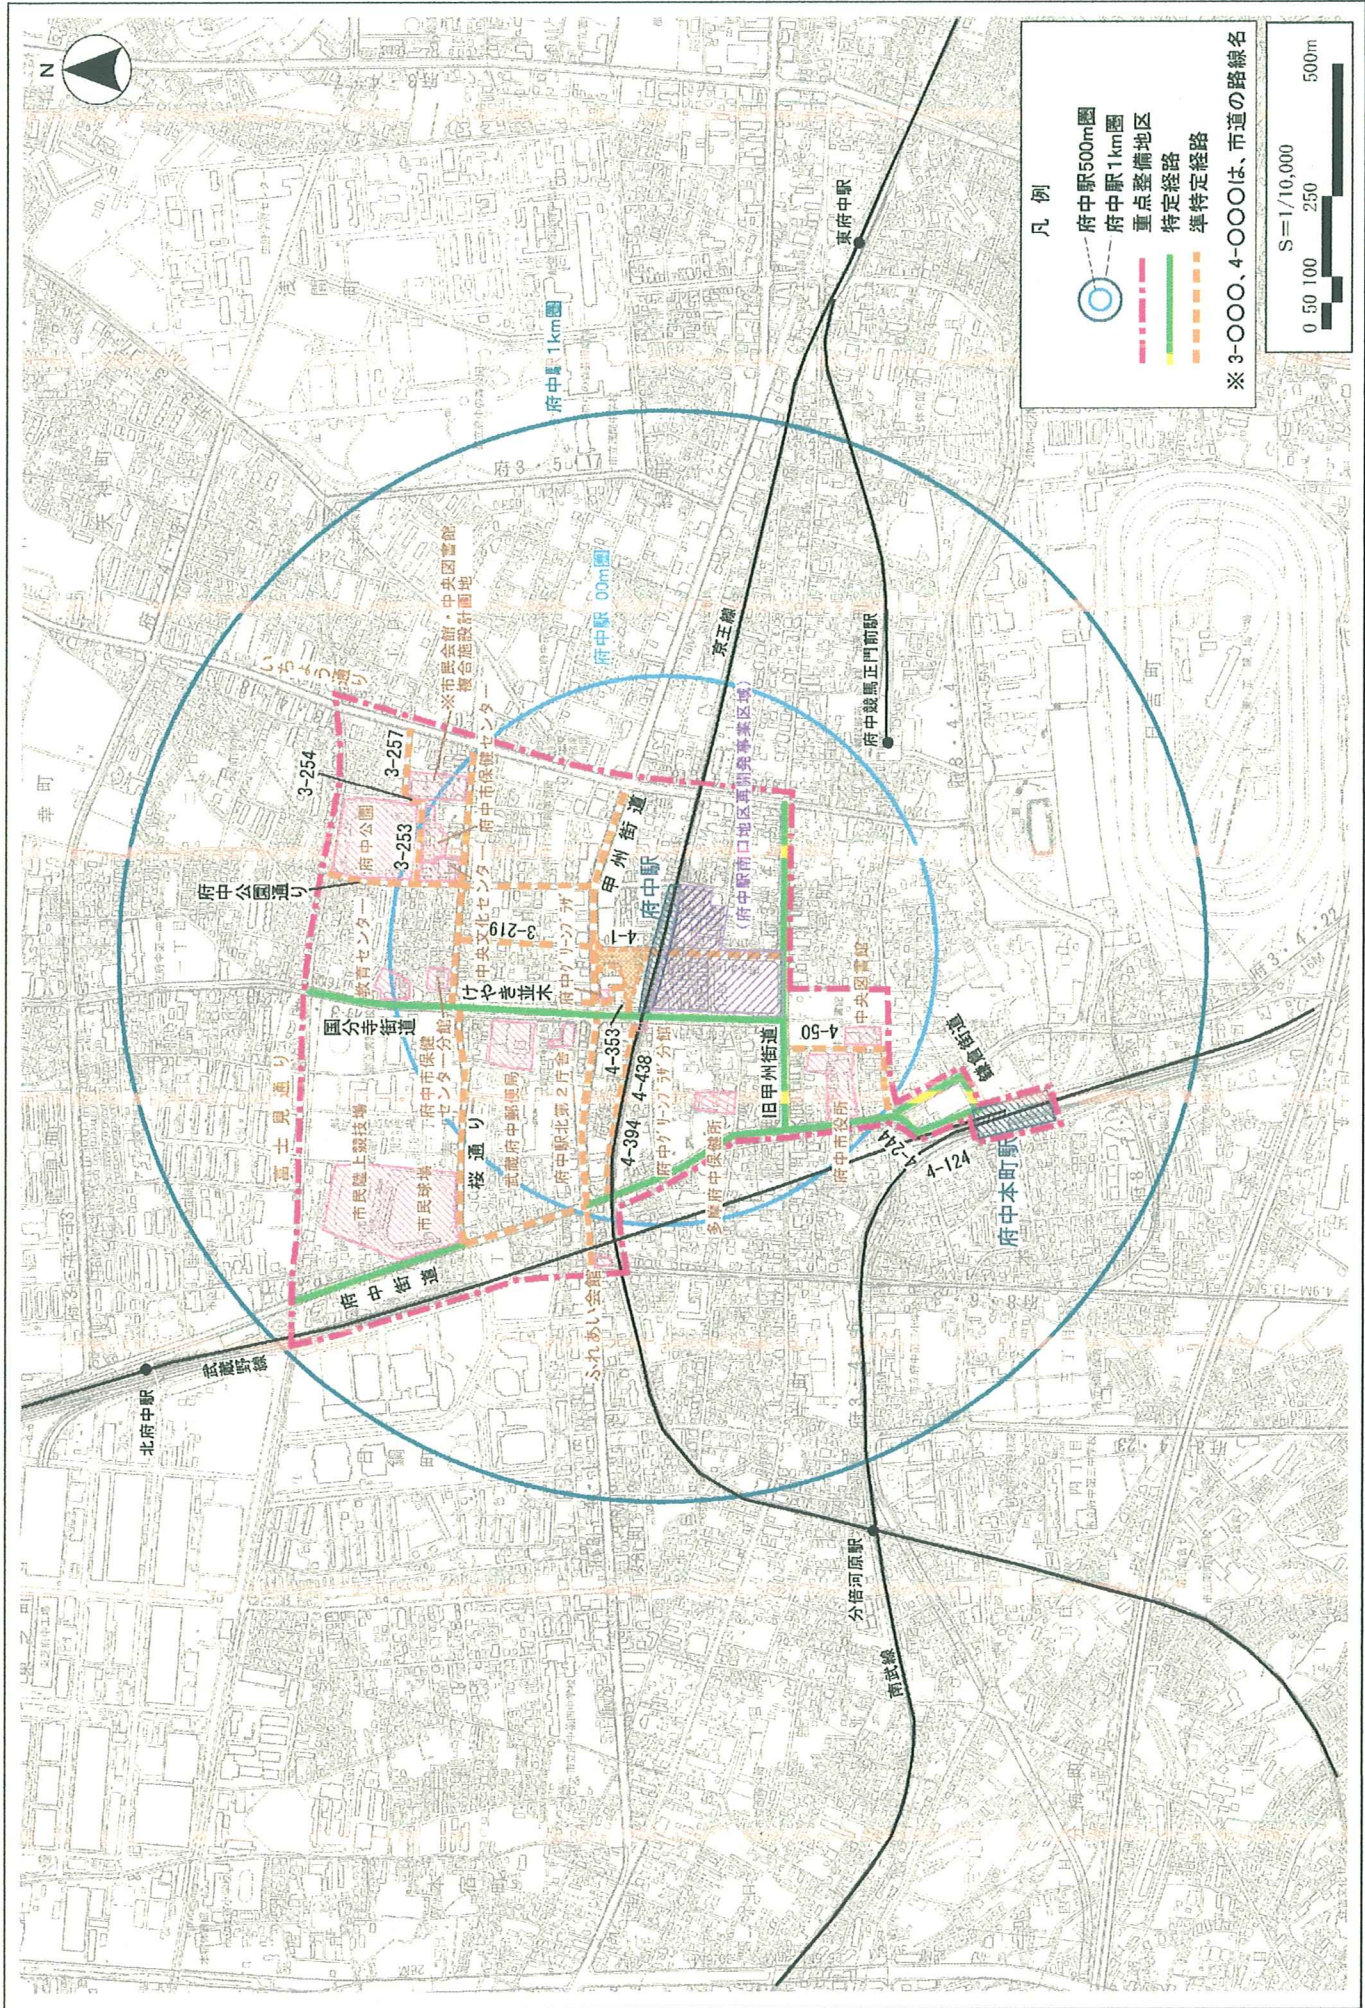

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成20年 3 月末 現在)

事業者名	府中市	計画 及び 実施	年 度				実施状況及び計画変更理由			
番号	事業内 容		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度	実施状況
1	けやき並木（桜通り～旧甲州街道）(特定経路 延長:約620m)									
1	再開発A地区協への視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施								実施済み100%
2	視覚障害者誘導用ブロックの連続性確保と交差道路の停止線、標識の整合	計画 実施								実施済み100%
3	小判状線状ブロックの敷設替え	計画 実施								実施済み100%
4	音響式信号機設置箇所の視覚障害者誘導用ブロックの敷設替え	計画 実施								実施済み100%
5	横断歩道部の歩車道段差の改良、すり付け直し	計画 実施								バリアーを設けることになっているので中止を検討中
6	横断方向と視覚障害者誘導用ブロックの不一致箇所等直し	計画 実施								実施済み100%
7	放置自転車対策、ちよこりん・スポットの継続的実施	計画 実施								継続実施中
2	市道4-124号～4-244- (特定経路 延長:約170m)									
1	スーパーへの駐輪対策の継続的取組要請	計画 実施								継続実施中
2	放置自転車対策の継続的取組	計画 実施								継続実施中

[illegible]

5	市道府中公園通り (準特定経路 延長:約480m)	1 危険樹木の植替え	計画 実施	                                                      <
---	------------------------------	---------------	----------	--

[illegible]

12	市道4-438号～4-394号（準特定経路 延長：約320m）																
1	横断指導線の設置、優先方向の調整	計画 実施															調整済み
2	路面表示、カラー舗装	計画 実施															
13	誘導サイン計画 他																
1	誘導サインの検討、整備	計画 実施															
2	心のバリアフリーに関する取組	計画 実施															継続実施中 「福祉まつり」への参加
3	自転車利用者のルールとマナーに関する普及啓発活動	計画 実施															継続実施中
4	学校教育に関する取組	計画 実施															継続実施中
5	施設のバリアフリー対応状況などに関する情報提供	計画 実施															継続実施中

その他特記事項	
---------	--

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成20年 3 月末 現在)

事業者名	国土交通省相武国道事務所	計画 及び 実施	年 度					(各年度内は四半期ごとに枠を設定)	実施状況及び計画変更理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	事業内 容		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		22年度	19年度	実施状況	計画どおり実施できない理由又は は施工にあたっての問題点等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

その他特記事項

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成20年 3 月末 現在)

事業者名	事業内容	計画及び実施	年度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)					実施状況及び計画変更理由		
番号			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度 実施状況	計画どおり実施できない理由又は は施工にあたっての問題点等
1 府中街道①（鎌倉街道～寿町三丁目交差点）（特定経路 延長：745m）										
1	視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施							実施済み 100%	
2	巻き込み部の勾配緩和	計画 実施							実施済み 100%	
2 府中街道②（市民球場前交差点～晴見町二丁目交差点）（特定経路 延長：340m）										
1	視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施							18、19、20年度は用地買収。西側歩道工事中	
2	歩道横断勾配の緩和	計画 実施								
3	巻き込み部の勾配緩和	計画 実施								
4	歩道幅員2.0m以上確保	計画 実施								
3 鎌倉街道（府中本町駅～府中街道）（特定経路 延長：70m）										
1	視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施							実施済み 100%	
2	巻き込み部の勾配緩和	計画 実施							実施済み 100%	

[illegible]

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

平成20年 3 月末 現在

事業者名	東日本旅客鉄道株式会社	計画 及び 実施	年 度				(各年度内は四半期ごとに枠を設定)				実施状況及び計画変更理由	
番号	事業内容		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度	実施状況	計画どおり実施できない理由又は は施工にあたっての問題点等	
1	府中本町駅											
1	エレベーターの設置 (府中本町駅)	計画 実施										
2	車両のバリアフリー化	計画 実施										
3	駅員、乗務員のバリアフ リー教育の推進、教育内 容の充実	計画 実施										

その他特記事項

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成20年 3 月末 現在)

事業者名	京王電鉄株式会社	計画及び実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)					実施状況及び計画変更理由		
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度 実施状況	計画どおり実施できない理由または施工にあたっての問題点等
番号	事業内容									
1 府中駅										
1	改札外手すりの点検・改善	計画 実施								実施済み 【進捗率:100%】
2	「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」に基づく、音声や音響による案内、誘導の検討	計画 実施								「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」に基づき、駅構内の主要な場所において音声や音響による案内、誘導を実施【進捗率:100%】
3	旅客施設と歩道の視覚障害者誘導用ブロックの連続性の確保に関する道路管理者との協議	計画 実施								実施済み 【進捗率:100%】
4	車両のバリアフリー化の推進	計画 実施								京王線の車両38両に車内電光表示板・ドアチャイムを設置したほか、6列車に車いすスペースを設置 【進捗率:69%】
5	駅員、乗務員のバリアフリー教育の推進、教育内容の充実	計画 実施								新たに113名が「サービス助手士2級」を取得【25%が所得】

その他特記事項

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成20年 3 月末 現在)

事業者名	京王電鉄バスグループ	計画及び実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)					実施状況及び計画変更理由		
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度 実施状況	計画どおり実施できない理由又は施工にあたっての問題点等
番号	事業内容									
1 バス										
1	車両のバリアフリー化	計画								対応車172両 対応率100% 車内での音声によるバス停留所案内及びバス停留所名表示 対応率 100%
		実施								
2	乗務員のバリアフリー教育の推進、教育内容の充実、乗務員による音声案内	計画								新入社員教育時のデイサービス施設体験入所実施 (継続) バスモニターの添乗監察による乗務員接遇サービス向上教育の実施 (継続)
		実施								

その他特記事項

平成19年度実績
ノンステップバス10両新造
府中市内の路線バス バリアフリー化100%達成

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成20年 3 月末 現在)

事業者名	東京都公安委員会	計 画 及 び 実 施	年 度（各年度内は四半期ごとに枠を設定）					実施状況及び計画変更理由							
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度 実施状況	計画どおり実施できない理由又は は施工にあたっての問題点等					
番号	事 業 内 容	計 画 実 施	1 信号機・その他												
1	バリアフリー対応型信号機 の設置	計 画 実 施												宮町1丁目35番地先	
2	LED式信号灯器への更新	計 画 実 施												旧甲州街道。府中街道。 小金井街道	
3	横断歩道、横断指導線の 新設	計 画 実 施												ルミエール府中前、北	
4	違法駐車行為の防止に関 する広報、啓発活動	計 画 実 施												継続実施中	

その他特記事項
