


平成18年度府中市交通バリアフリー  
特定事業計画の実施について

平成19年7月

都市整備部土木課



特定経路・準特定経路（府中駅・府中本郷駅周辺地区）

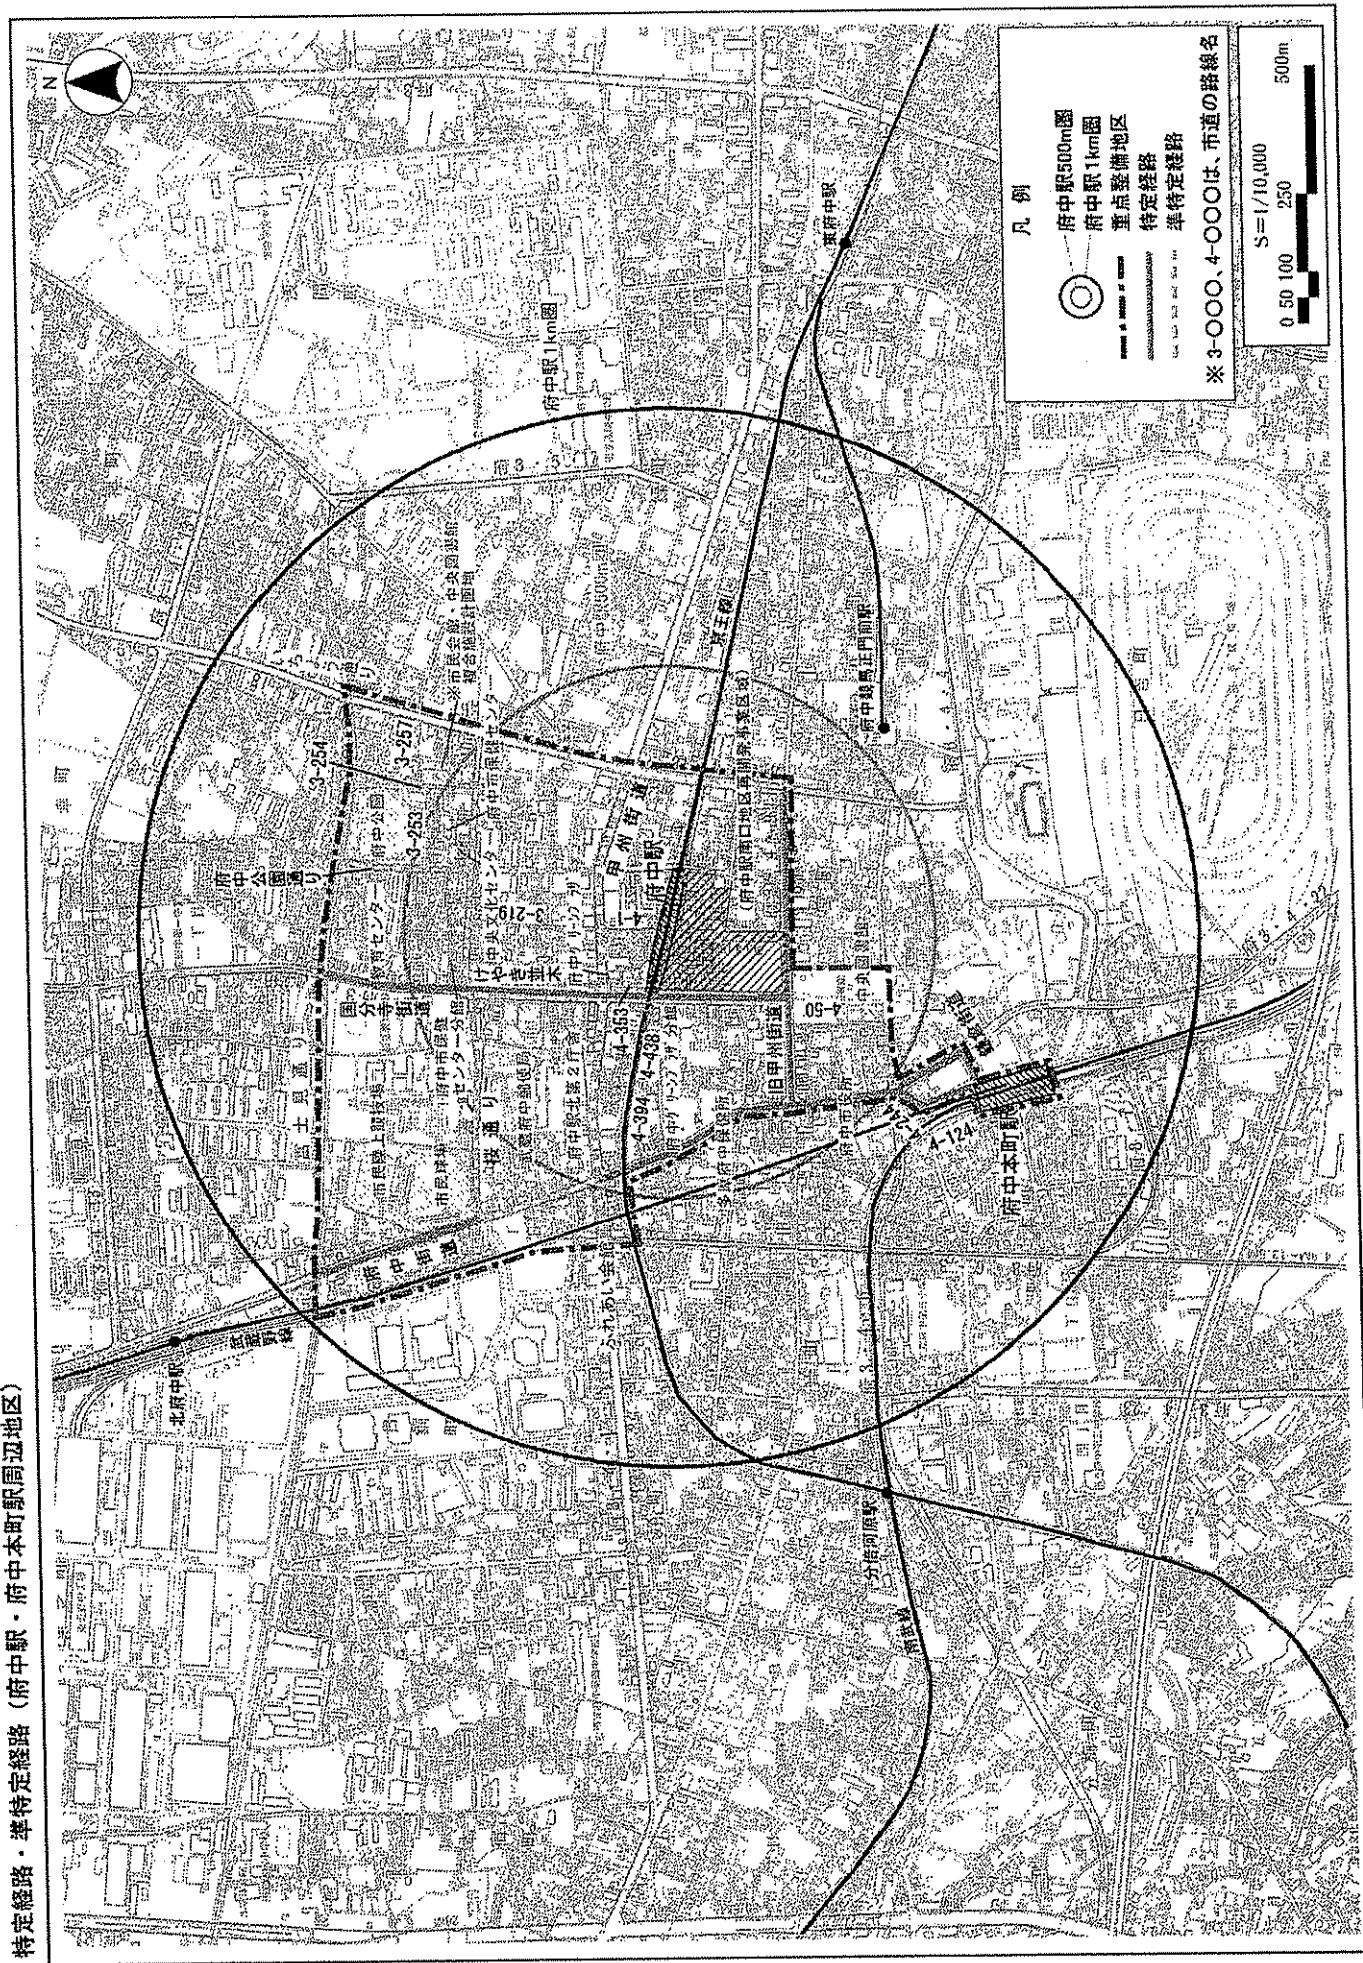

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成19年 3月末 現在)

事業者名	府中市	計画及び実施	年度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)					実施状況及び計画変更理由	
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
<b>けやき並木(桜通り～旧甲州街道)(特定経路 延長:約620m)</b>									
1	再開発A地区脇への視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画実施						施工済み	
2	視覚障害者確保用ブロックの連続性確保と交差道路の停止線、標識の整合	計画実施						視覚障害者誘導用ブロックの連続確保は施工済、その他については19年度に施工	
3	小判状線状ブロックの敷設替え	計画実施						施工済み	
4	音響式信号機設置箇所の視覚障害者誘導用ブロックの敷設替え	計画実施						施工済み	
5	横断歩道部の歩車道段差の改良、すり付け直し	計画実施						19年度予定	
6	横断方向と視覚障害者誘導用ブロックの不一致箇所等直し	計画実施						施工済み	
7	放置自転車対策、ちよこりん・スポットの継続的実施	計画実施						継続実施中	
2	市道4-124号～4-244-(特定経路 延長:約170m)								
1	スーパーへの駐輪対策の継続的取組要請	計画実施						継続実施中	
2	放置自転車対策の継続的取組	計画実施						継続実施中	

3 市道4-1号～4-353号 (準特定経路 延長:約370m)

							現況調査検討済
1	歩車道段差の改良、歩道の勾配改良	計画 実施					
2	視覚障害者誘導ブロックの着色(ペデストリアンデッキを含む)	計画 実施					
3	バスの乗降方法に合わせた視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施					
4	歩道と駅入り口の視覚障害者誘導用ブロックの連続性の確保	計画 実施					
5	ペデストリアンデッキと地上を結ぶエレベーター設置の検討	計画 実施					

4 市道桜通り (準特定経路 延長:約950m)

							統一的に検討していくます
1	危険樹木の植替え	計画 実施					一部伐採
2	バス停の乗場側への視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施					
3	横断指導線の調整、設置	計画 実施					複合施設(北側)と含めて整備を統一的に進めていく
4	街路樹(桜)の扱いの検討	計画 実施					平成16年度調査結果を基に、育成を進めていく
5	歩車道段差の改良、歩道の勾配の改良等を含めた改良	計画 実施					

5 市道府中公園通り (準特定経路 延長:約480m)			
1 危険樹木の植替え	計画実施	計画実施	引き続き危険樹木の状況を観察する
2 視覚障害者誘導用ブロックへの未設置の横断歩道部へのブロック敷設	計画実施	計画実施	
3 街路樹(桜)の扱いの検討	計画実施	計画実施	樹木の状況を観察していく
4 歩車道段差の改良、歩道の勾配の改良等を含めた改良	計画実施	計画実施	
5 東側歩道(甲州街道～桜通り間)への視覚障害者誘導用ブロックの連続的敷設	計画実施	計画実施	
6 市道3-253号 (準特定経路 延長:約150m)			
1 ちゅうバス停への視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画実施	計画実施	
2 横断歩道部の歩車道段差の改良	計画実施	計画実施	19年度工事予定
3 横断歩道部の視覚障害者誘導用ブロックの敷設替え	計画実施	計画実施	19年度工事予定
7 市道3-254号 (準特定経路 延長:約40m)			
1 交差点改良、横断歩道の調整・設置	計画実施	計画実施	
2 横断歩道部の視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画実施	計画実施	19年度工事予定

8 市道3-257号 (準特定経路 延長:約130m)

1 幅員構成の変更、南側歩道、横断歩道、横断線の設置調整	計画実施		
2 幅員構成の変更、歩道拡幅	計画実施		19年度工事予定
3 視覚障害者誘導用ブロッケーの敷設	計画実施		19年度工事予定
4 車落防止柵の設置	計画実施		19年度工事予定
参考複合施設工事	計画実施	解体建設	工事中

9 市道3-219号 (準特定経路 延長:約240m)

1 地元の意向把握	計画実施		アンケートにより地元の意向調査
2 横断歩道、横断指導線設置などに関する調整	計画実施		調査結果により中止
3 路面表示、カラー舗装、片側歩道設置あるいは柵の設置	計画実施		調査結果により中止
			(大國魂神社北西角～南西角)(準特定経路 延長:約190m)
10 市道4-50号			
1 視覚障害者誘導用ブロッケーの連続敷設	計画実施		18~19年度工事中
2 歩道の平坦性の確保	計画実施		18~19年度工事中
11 市道4-50号			
1 路面表示、カラー舗装、L型側溝改修	計画実施		18~19年度工事中

## 12 市道4-438号～4-394号 (準特定経路 延長:約320m)

1	横断指導線の設置、優先方向の調整	計画実施									調整済み
2	路面表示、カラー舗装	計画実施									

## 13 誘導サイン計画 他

1	誘導サインの検討、整備	計画実施									
2	心のバリアフリーに関する取組	計画実施									継続実施中「福祉まつり」への参加
3	自転車利用者のルールとマナーに関する普及啓発活動	計画実施									継続実施中
4	学校教育に関する取組	計画実施									継続実施中
5	施設のバリアフリー対応状況などに関する情報提供	計画実施									継続実施中

その他特記事項

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成19年 3月末現在)

事業者名 番号	国土交通省相武国道事務所 事業内容	計画 及び 実施	年度					(各年度内に四半期ごとに枠を設定)			実施状況及び計画変更理由
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度			
1	甲州街道（小金井街道入口交差点～ふれあい会館前）（準特定経路 延長：約1,000m）										
1	実施計画の立案・作成	計画 実施									
2	歩道整備	計画 実施									19年度工事予定
3	横断歩道橋改修	計画 実施									用地取得 19年度工事予定

その他特記事項



4	旧甲州街道（府中市役所前交差点～八幡宿交差点）(特定経路 延長:620m)		
1	視覚障害者誘導用ブロックの連続敷設	計画実施	実施済み 100%
2	歩道横断勾配の緩和(2箇所)	計画実施	実施済み 100%
3	巻き込み部の勾配緩和(2箇所)	計画実施	実施済み 100%
5	国分寺街道（けやき並木北交差点～富士見通り）(特定経路 延長:285m)		
1	視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画実施	
2	歩道横断勾配の緩和	計画実施	
3	巻き込み部勾配緩和	計画実施	
6	府中街道③（寿町三丁目交差点～市民球場前交差点）(準特定経路 延長:240m)		
1	視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画実施	西側歩道実施済み 50%
2	歩道横断勾配の緩和	計画実施	西側歩道実施済み 50%
3	巻き込み部の勾配緩和	計画実施	西側歩道実施済み 50%

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

平成19年 3月末 現在

事業者名 番号	事業内容	計画及び実施	年度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)						実施状況及び計画変更理由		
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	18年度実施状況	計画どおり実施できない理由又は施工にあたっての問題点等	
1	府中本町駅	計画実施									
1	エレベーターの設置 (府中本町駅)	計画実施								エレベーター(4基)・誘導 警音プロック設置完了	
2	車両のバリアフリー化	計画実施								継続実施中	
3	駅員、乗務員のバリアフ リー教育の推進、教育内 容の充実	計画実施								継続実施中	

その他特記事項

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況 調査票

(平成19年 3月末 現在)

事業者名 番号	京王電鉄株式会社 事業内容	計画及び実施		年度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)			実施状況及び計画変更理由		
		計画	実施	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
1	府中駅								
1	改札外手すりの点字内 容の点検・改善	計画 実施							
2	「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」による移動支援方策に基づく、音声導の音響による点検	計画 実施							
3	旅客施設と歩道の視覚障害者誘導用ブロック連続性の確保に関する協議	計画 実施							
4	車両のバリアフリー化の推進	計画 実施							
5	駅員、乗務員のバリアフ リー教育の推進、教育内 容の拡充	計画 実施							
【実施済み 【進捗率:100%】									
「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」に基づく場所において、案内内容や駆動間隔などを、駆構内での実地試験にて検討 【進捗率:約30%】									
弊社管理区域内の視覚障害者誘導用ブロック敷設については、道路管理者の敷設工事終了後の平成18年3月末に着手し、4月上旬に完了 【進捗率:100%】									
京王線の車両54両に車内電光表示板・ドアチャイムを設置したほか、6列車に車いすスペースを設置 【進捗率:62%】									
新たに123名が「サービス介助士2級」を取得									

その他特記事項

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況 調査票

(平成19年 3月末 現在)

事業者名 番号	事業内容 バス	計画 及び 実施		年 度 (各年度内は四半期ごとに特を設定)				実施状況及び計画変更理由			
		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	18年度	実施状況	計画どおり実施できない理由	
1	車両のバリアフリー化	計画	実施					対応車169両 対応率98.8% 車内での音声によるバス停 留所案内及びバス停留所名 表示 対応率 100%			又は施工にあたつての問題点等
2	乗務員のバリアフリー教育の 推進、教育内容の充実、乗 務員による音声案内	計画	実施					新入社員教育時でのティ サービス施設体験入所実 施 (継続) バスモニターの添乗監察に よる乗務員接遇サービス向 上教育の実施 (継続)			

その他特記事項

平成18年度実績  
ノンステップバス 10両新造

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成19年 3月末 現在)

事業者名 番号	東京都公安委員会 事業内容	計画 及び 実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)				実施状況及び計画変更理由		
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	18年度
<b>1 信号機・その他</b>									
1	パリアフリー対応型信号機の設置	計画実施							信号機4ヶ所設置今後も随時上申
2	LED式信号灯器への更新	計画実施							ルミエール府中前
3	横断歩道、横断指導線の新設	計画実施							ルミエール府中前
4	違法駐車行為の防止に関する広報、啓発活動	計画実施							継続実施中

その他特記事項

